


**RUDNIK ŽIROVSKI VRH,
JAVNO PODJETJE ZA ZAPIRANJE RUDNIKA URANA D.O.O.**


**LETNO POROČILO O POSLOVANJU
ZA LETO 2011**

Todraž, julij 2012

Vsebinsko pripravil:


Peter Dolenc, univ. dipl. ekon.,
Direktor

Uvodno poglavje:


Hiacinta Klemenčič, univ. dipl. kem.,
V.d. direktorice

V S E B I N A

	Stran
PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA	1
1.0 UVOD	3
2.0 PREDSTAVITEV POSLOVANJA V LETU 2011	5
3.0 IZVAJANJE OSNOVNIH PROJEKTOV	8
3.1 Odlagališče rudarske jalovine Jazbec	8
3.1.1 Raziskave in verifikacija normativov – ZI	8
3.1.2 Izdelava PGD in pridobivanje GD Jazbec – ZI	8
3.1.3 Izgradnja dolgoročnega monitoringa Jazbec	8
3.1.4 Pripravljalna in vzdrževalna dela odlagališče Jazbec in druga zemljišča	8
3.2 Odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt	9
3.2.1 Raziskave in verifikacija normativov	9
3.2.2 Izdelava PGD in pridobivanje soglasij za odlagališče Boršt – ZI	10
3.2.3 Odlagališče Boršt	10
3.2.4 Ceste na Boršt – ZI	10
3.2.5 Nadzor nad izvajanjem del Boršt (EU + strokovni)	10
3.2.6 Izgradnja dolgoročnega monitoringa Boršt	10
3.2.7 Pripravljalna in vzdrževalna dela	11
4.0 MONITORING IN VZDRŽEVANJE (UPRAVLJANJE)	12
5.0 ZAGOTAVLJANJE POGOJEV	13
5.0.1 Varstvo pri delu in varovanje zdravja	13
5.0.2 Infrastruktura in tehnološki sklopi	13
5.0.3 Skupne naloge	14
5.1 Odškodnine	14
5.1.1 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	14
5.1.2 Odškodnine za povzročeno škodo na tujih zemljiščih	14
5.2 Oprema	15
5.3 Lastna dejavnost	15
5.3.1 Prihodki lastne dejavnosti	15
5.3.2 Stroški lastne dejavnosti	15
5.3.3 Izgradnja gospodarske cone Todraž	15
5.3.4 Nadomestilo za omejeno rabo prostora	15
5.3.5 Dezinvestiranje	16
5.4 Prezaposlovanje	
6.0 FINANČNI DEL	17
6.1 Viri financiranja	17
6.1.1 Proračunski viri	17
6.1.2 Lastni viri	17
6.2. Celotni stroški	17
6.2.1 Stroški izvajanja projekta zapiranja	17
6.2.2 Stroški lastne dejavnosti	18
6.3 Pokritje stroškov z viri sredstev	19
6.3.1 Pokritje stroškov za izvajanje projekta zapiranja	19
6.3.2 Pokritje stroškov lastne dejavnosti	20

	Računovodski izkazi	21
7.0	ZAKLJUČEK	22
Priloga 1	Tabele stroškov	23
Priloga 2	Izkaz poslovnega izida	28
Priloga 3	Bilanca stanja	29

PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA

Rudnik Žirovski vrh je javno podjetje, katerega ustanovitelj in lastnik je Republika Slovenija.

Ime podjetja: Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o.

Skrajšano ime: RŽV, d.o.o.

Lastnik: Republika Slovenija

Sedež: Todraž 1, 4224 Gorenja vas

Matična številka: 5159709000

Št. registrskega vložka: 1/00197/00, Okrožno sodišče Kranj

Ustanovitveni kapital: 5.927.355,00 EUR

Upravljanje in vodenje javnega podjetja

Skupščina javnega podjetja: v vlogi skupščine Vlada Republike Slovenije

Nadzorni svet javnega podjetja :	dr. Samo Kopač	predsednik
	Elizabeta Rakovec	podpredsednica
	mag. Nives Nared	članica
	Ivan Gantar	član

Uprava javnega podjetja:	Peter Dolenc	direktor
--------------------------	--------------	----------

Naloge javnega podjetja

Osnovna naloga Rudnika Žirovski vrh je izvedba trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v rudniku urana Žirovski vrh in zavarovanje okolja in ljudi pred posledicami rudarjenja v RUŽV.

Zakonske in programske osnove

- Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (ZTPIU-Ur.l. RS, št. 36/1992),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh - ZTPIU-A (Ur.l. RS, št. 28/2000),
- Uredba o preoblikovanju Rudnika Žirovski vrh p.o. v Rudnik Žirovski vrh d.o.o. (Ur.l. RS, št. 79/2001),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh - ZTPIU-B (Ur.l. RS, št. 121/2005),
- Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh uradno prečiščeno besedilo (ZTPIU-UPB1Ur.l. RS, št. 22/2006),
- Noveliran program izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in preprečevanje posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh, IBE, 2001, št. proj. UZVI-B103/29,
- Noveliran program izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in preprečevanje posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh v obdobju 2006 do 2010, IBE, 2006, št. proj. UZVI-B103/29B (v nadaljevanju Novelirani program št. 2),

- Uredba o določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora za območje Rudnika urana Žirovski vrh (Ur. l. RS št. 22/2008).

Naloge iz 2. člena ZTPIU

Po ZTPIU so naloge RŽV naslednje:

- načrtovanje in izvedba začasnega zavarovanja okolja ter objektov pred nevarnostjo za zdravje ljudi, dokler se ne bo v celoti začel izvajati,
 - načrtovanje in izvedba zaprtja objektov,
 - načrtovanje in izvedba trajnega zavarovanja okolja pred posledicami izkoriščanja uranove rude in potrebno dekontaminacijo,
 - zagotavljanje nadzora nad zavarovanjem okolja, vključno z radiološkim in meteorološkim monitoringom v času zapiranja in po zaprtju rudnika,
 - programiranje in uvedba primernih nadomestnih dejavnosti za zaposlovanje delavcev, ki v rudniku niso več potrebni, s posebno presojo vplivov na okolje, če gre za uvedbo dejavnosti na območju rudnika,
 - spremljanje zdravstvenega stanja delavcev, ki delajo ali so delali na delovnih mestih z beneficirano delovno dobo.
-
- Javno podjetje izvaja z lastnimi delavci dolgoročno upravljanje, zagotavlja pogoje za delo zunanjih izvajalcev in zagotavlja delovanje vseh poslovnih funkcij javnega podjetja.
 - Sredstva za izvedbo zapiralnih in sanacijskih del se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
 - RŽV sofinancira izgradnjo komunalne infrastrukture za GC Todraž, ki dejansko pomeni realizacijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, ki jih je lokalna skupnost izgubila z zaprtjem rudnika.

1.0 UVOD

Letno poročilo Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. (v nadaljevanju RŽV), je izdelano na osnovi določb 10. člena Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Ur.l. RS, št. 36/1992), v nadaljnjem besedilu ZTPIU.

Navedeni zakon zahteva izdelavo poročila o izvajanju programa vsako leto. Programsko osnovo za izdelavo poročila je do leta 2006 predstavljal »Noveliran program izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh«, IBE, 2001, št. proj. UZVI-B103/29 (v nadaljevanju Noveliran program), ki je bil izdelan aprila 2001. Vlada RS ga je sprejela s sklepom št. 310-00/2001-3 dne 31. 05. 2001. V tem programu je bilo opredeljeno obdobje izvajanja del od leta 2001 do 2005.

Z letom 2005 je bilo zaključeno obdobje izvajanja del po Noveliranem programu, prav tako se je iztekla veljavnost ZTPIU.

S sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh - ZTPIU-B (Ur.l. RS, št. 121/2005), je bilo izvajanje sanacijskih del podaljšano v obdobje 2006-2010. ZTPIU-B nalaga tudi izdelavo revizije Noveliranega programa. RŽV jo je izdelal v začetku leta 2006 pod imenom Novelirani program izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in preprečevanje posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh v obdobju 2006 do 2010, IBE, april 2006, št. proj. UZVI-B103/029B (v nadaljevanju Novelirani program št. 2). Vlada Republike Slovenije ga je sprejela 23. 11. 2006 s sklepom št. 36100-17/2006/4. Dejansko je Novelirani program št. 2 vsebinsko nadaljevanje Noveliranega programa s spremenjeno dinamiko izvajanja del in natančnejšo določitvijo vsebine še ne izvedenih del. Novelirani program št. 2 temelji v celoti na izdelani projektni dokumentaciji. Projektna dokumentacija je bila tudi osnova za vse ponudbe izvajalcev del.

Metodološko je Letno poročilo za 2011 izdelano enako, kot Novelirani program št. 2 in Poslovni načrt Rudnika Žirovski vrh za leto 2011 (v nadaljevanju PN 2011). Tako je omogočena enostavna spremljava realizacije načrtovanih aktivnosti Noveliranega programa št. 2 in PN 2011. V skladu z metodologijo planiranja so stroški prikazani po četrtletjih.

Letno poročilo o poslovanju Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana d.o.o., za leto 2011 (v nadaljevanju LP 2011) vsebuje navedbo vseh izvedenih del in aktivnosti zapiranja, sanacije in dolgoročnega upravljanja v letu 2011, kakor tudi vseh ostalih potrebnih del. Stroškovno je prikazana tudi primerjava izvedenih del z načrtovanimi. Pri oceni poslovanja v letu 2011 ugotavljamo, da je bilo opravljenega veliko dela, vendar poslovanje ni bilo uspešno. Indeks realizacije glede na plan je 85 %. Čisti poslovni izid za leto 2011 je pozitiven zaradi prodaje vrednostnih papirjev, ki so bili v poslovnih knjigah vrednoteni po nabavni ceni, ki je bila nižja od tržne vrednosti. Kratkoročne poslovne obveznosti na dan 31. 12. 2011 v bilanci stanja presegajo kratkoročna sredstva.

Na odlagališčih Jazbec in Boršt se je nadaljevalo izvajanje dolgoročnega upravljanja, ki obsega tekoče vzdrževanje in monitoring. Tekoče se je izvajal nadzor nad vplivi na okolje in varstvo pri delu. Vsi ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje so bili izvedeni skladno s planom. Rezultati monitoringa kažejo zmanjšanje vplivov na okolje, kar je v skladu s predvidevanjem.

Na odlagališču Boršt so bili izvedeni interventni raziskovalni ukrepi. Dodatni interventni drenažni ukrepi, ki jih je določil Strokovni projektni svet, zaradi omejenih finančnih sredstev niso bili izvedeni.

Ministrstvo za okolje in prostor je po odločitvi ministra dr. Roka Žarnića delo družbe prenehalo financirati v avgustu 2011, čeprav so bila proračunska sredstva za zapiranje rudnika zagotovljena. Od 1.441.614,00 EUR zagotovljenih proračunskih sredstev za leto 2011 jih je RŽV prejel le 783.135,66 EUR. Zato so se v drugi polovici leta izvajala samo dela dolgoročnega upravljanja, splošna dela in dela, ki so bila začeta pred prenehanjem financiranja.

Zaradi nastale situacije in prekinjene komunikacije med Ministrstvom za okolje in prostor (dr. Roko Žarnić, ga. Barbara Avčin Tržan) in vodstvom RŽV (g. Peter Dolenc) je 27. 9. 2011 odstopila članica NS mag. Nives Nared, 9. 10. 2011 pa še predsednik NS dr. Samo Kopač, tako da NS ni bil več sklepčen. Direktor RŽV je o obeh odstopih AUKN pisno obvestil 11. 11. 2011. Novi članici NS sta bili imenovani šele konec maja 2012. Zaradi nesklepčnosti NS ni bil sprejet niti PN 2011 niti LP 2011. V PN 2011 je bilo načrtovano, da bo RŽV s sredstvi iz proračuna pokrival obveznosti za izvajanje programa v skladu z ZTPIU, z lastnimi sredstvi pa plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora Občini Gorenja vas – Poljane v skladu z Uredbo o določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora za območje Rudnika urana Žirovski vrh. Ker je bilo financiranje iz proračuna prekinjeno, je RŽV pokrival stroške izvajanja programa z lastnimi sredstvi in zato ustavil plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora. Tako je RŽV zagotovil izvajanje predpisanih nalog in pokrivanje tekočih obveznosti do dobaviteljev in do delavcev do konca leta 2011.

2.0 PREDSTAVITEV POSLOVANJA V LETU 2011

RŽV je izdelal PN 2011 v začetku decembra 2010. Na 23. redni seji ga je obravnaval in sprejel nadzorni svet s sklepom št.133.

Ministrstvo za okolje in prostor oziroma minister Žarnić PN 2011 ni posredoval v sprejem vladi RS. Nadzorni svet je na 24. redni seji dne 16. 05. 2011 apeliral na MOP, da posreduje PN 2011 v sprejem, vendar minister tega ni storil.

Ker PN 2011 ni bil sprejet, je bilo do konca julija zagotovljeno začasno financiranje s sklenitvijo Pogodbe št. 2511-11-200015 in z Aneksom št. 1 k navedeni pogodbi.

RŽV je za 25. sejo NS, ki naj bi bila oktobra 2011 pripravil spremenjen predlog PN 2011 ob upoštevanju nastale situacije. Zaradi odstopa predsednika in članice NS ni bil več sklepčen, zato je seja odpadla.

Osnovni cilji PN 2011 so bili naslednji:

- izvedba sanacije drenažnega tunela pod odlagališčem Boršt,
- izvedba raziskovalnih drenažnih vrtin in strukturne drenažne vrtine,
- izvedba drenažnih vrtin in strukturnih vrtin po predlogu SPS,
- nadaljevati z izvajanjem nadzora nad vplivi na okolje,
- nadaljevati izvajanje varstva pri delu in varstva pred IO sevanji za zaposlene in druge delavce, ki izvajajo dela na naših objektih,
- izvajati vzdrževanje in upravljanje saniranih odlagališč Jazbec in Boršt,
- izvajati vsa splošna in druga opravila, ki bodo zagotavljala delovanje podjetja in izvajanje vseh predpisanih nalog,
- dokončati Center za dolgoročno upravljanje in informiranje javnosti,
- izdelati program aktivnosti RŽV oziroma njegovega naslednika za obdobje 2012- 2015.

Poleg osnovnih del je RŽV načrtoval tudi dejavnost, ki se ne nanaša na zapiranje in se ne financira iz proračunskih sredstev v višini 600.000,00 €:

- zagotoviti sodelovanje pri izgradnji gospodarske cone Todraž, v skladu s Pogodbo o neodplačnem prenosu nepremičnin iz leta 2004,
- ureditev Centra za dolgoročno upravljanje in informiranje javnosti,
- izpolnjevanje obveze plačila nadomestila za omejeno rabo prostora Občini Gorenja vas – Poljane.

Realizacija PN 2011

Vsa dela v letu 2011 so se izvajala skladno s PN 2011 do septembra. Delo so opravljali zunanji izvajalci in delavci RŽV.

Dokončana so bila interventna raziskovalna dela v rovu Boršt. Izvedena so bila vsa dela nadzora nad vplivi na okolje, varstva pri delu in varstva pred IO sevanji, dela upravljanja saniranih odlagališč in vsa opravila za zagotavljanje izvajanja vseh potrebnih nalog podjetja.

Dela zunanjih izvajalcev

V skladu s pogodbenimi obveznostmi so bila v prvem četrtletju zaključena raziskovalna drenažna vrtanja in sanacija podgradnje v rovu Boršt (RGP Velenje). Končana so bila dela na objektu Center za dolgoročno upravljanje in informiranje javnosti.

Dela RŽV na zagotavljanju pogojev v lastni režiji


RŽV je z lastnimi delavci zagotavljal pogoje za delo zunanjih izvajalcev 191.012,32 € (varstvo pri delu, fiksne obveznosti, plače, vzdrževanje objektov in infrastrukture), odškodnine 118.382,21, nabavo opreme 1.332,00 € in monitoring 325.303,82 €.

Dela, izvedena na odlagališču Jazbec, so bila v višini 15.955,924 € in so obsegala le redno vzdrževanje.

Izvedena dela na odlagališču Boršt so bila v višini 451.012,41 €. Od tega so bila dodatna dela na sanaciji tunela Boršt in vrtanju drenažnih vrtin (izvajalec RGP Velenje) v višini 80.103,31 €, izgradnja Centra za dolgoročno upravljanje (izvajalec CP Kranj) v višini 274.063,88 €, mednarodni nadzor Wismut in domači nadzor 56.647,73 € ter druga dela.

Skupna finančna vrednost realizacije del RŽV in zunanjih izvajalcev je prikazana v Tabeli 1 in v spodnjem grafikonu.

Grafikon: Plan in realizacija del stroškovno po vsebini

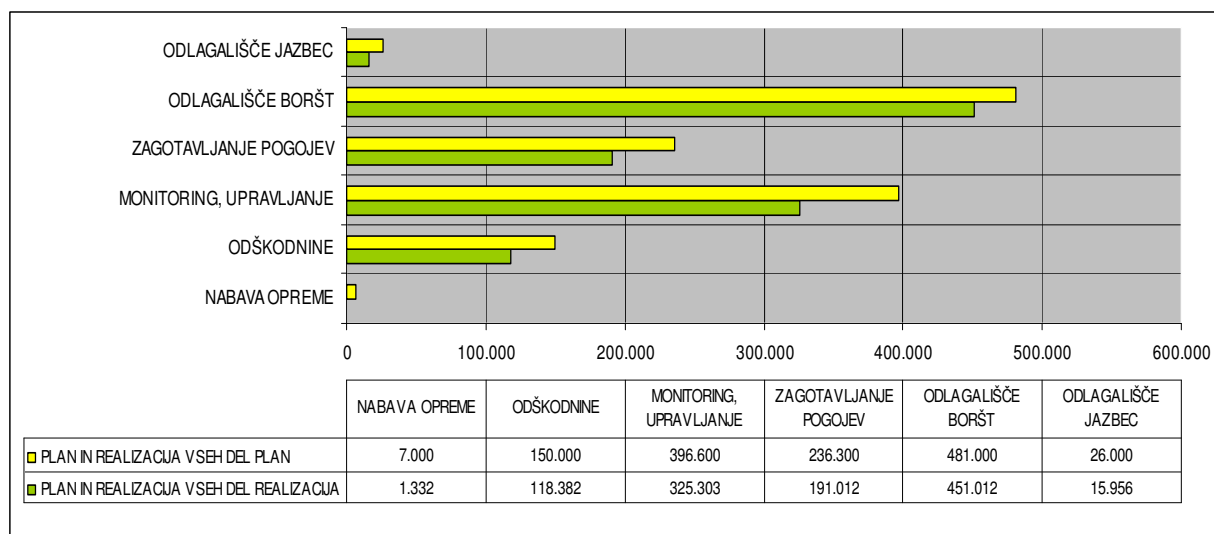


Realizacija Noveliranega programa št. 2

V Noveliranem programu št. 2 sta načrtovana dinamika izvajanja del in financiranje izvedbe del po vrednosti v letih od 2006 do 2010. V letu 2011 so se izvajala dela, ki v prejšnjih letih niso bila izvedena. V vseh letih je prihajalo do razlik med načrtovanimi in odobrenimi sredstvi ter dejansko realizacijo. Primerjava je podana v spodnjem grafikonu. Iz grafikona je razvidno, da je bil v letih 2006, 2007, 2008 in 2009 po Noveliranem programu št. 2 načrtovani vrednostni obseg del večji, kot je bila dejanska realizacija. Vzrok za razliko so bila manjša razpoložljiva sredstva iz proračuna RS. Prav tako je prišlo tudi do nekoliko spremenjene dinamike izvajanja del zaradi zahtevnosti in vremenskih razmer. Sprememba višine zagotovljenih sredstev in dinamika del nista ogrožala izvedbe del.

Delno je bila razlika med potrebnimi sredstvi po NP št. 2 in realizacijo zmanjšana v letih 2010 in 2011, ko je bilo zagotovljeno več sredstev, kot je bilo načrtovano v NP št. 2. Tudi v letu 2011 še niso bila izvedena vsa dela, ki so bila načrtovana v Noveliranem programu št. 2. Potrebno jih bo izvesti v 2012 ali kasneje v skladu z odločitvijo lastnika.

Celotna potrebna sredstva po NP št. 2 so bila 29.678.000,00 €. Do konca leta 2011 so bila porabljena sredstva v višini 28.690.000,00 €.

Grafikon: Primerjava Noveliranega programa št.2 in realizacije

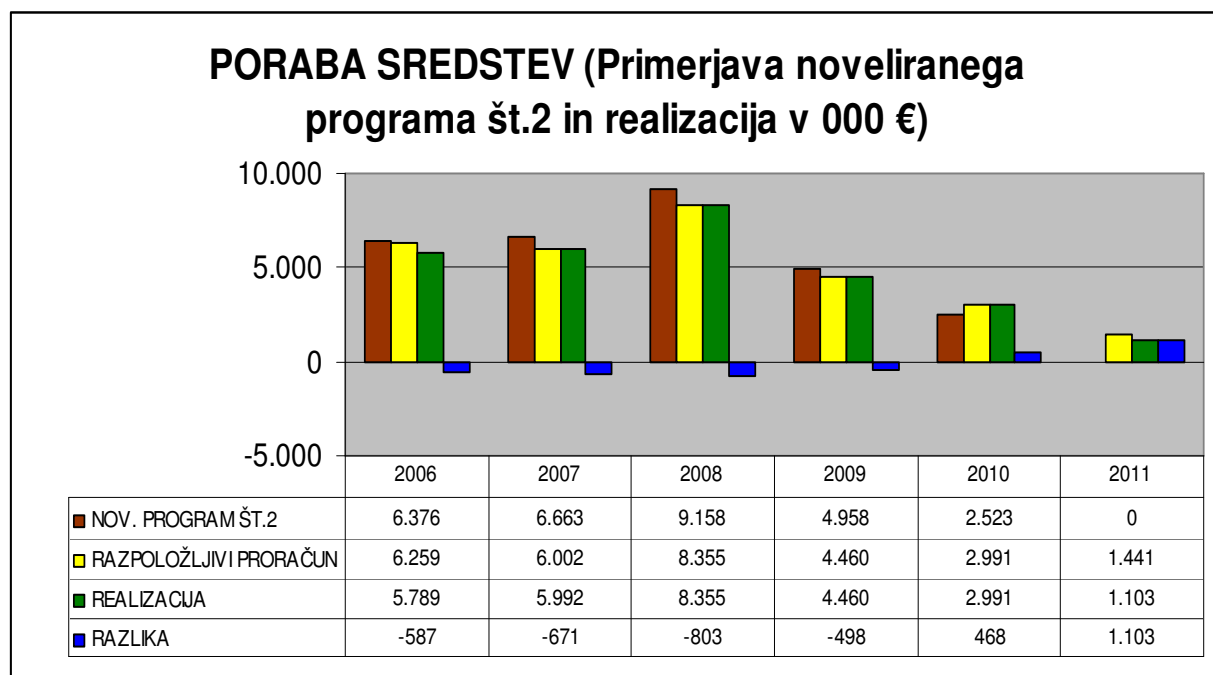

3.0 IZVAJANJE OSNOVNIH PROJEKTOV

V letu 2011 so se v okviru projekta trajne sanacije in končne ureditve odlagališč po Noveliranem programu št. 2 izvajala dela na dveh osnovnih projektih:

- odlagališču rudarske jalovine Jazbec,
- odlagališču hidrometalurške jalovine Boršt.

Celotni stroški sanacije in končne ureditve odlagališč in ostalih objektov, ki k njim spadajo, ter izdelava dokumentacije so razvidni v Prilogi 1 iz Tabel 2 in 3. Delo delavcev RŽV obsega vsa strokovno tehnična dela in potrebna dela dolgoročnega upravljanja ter druga potrebna dela. Strokovna dela, za katera RŽV nima usposobljenih delavcev, so bila naročena pri zunanjih izvajalcih.

3.1 Odlagališče rudarske jalovine Jazbec

Sanacijska dela na odlagališču rudarske jalovine Jazbec so bila končana v letu 2008. V letu 2011 se je nadaljevalo izvajanje dolgoročnega upravljanja in izdelava predpisane dokumentacije.

Stroški del so prikazani v Tabeli 2. Celotni stroški so bili manjši od načrtovanih (61,4 %).

3.1.1 834 Raziskave in verifikacija normativov – ZI

Za ugotavljanje stabilnosti odlagališča Jazbec je bila izvedena geodetska meritev stabilnosti, ki jo je izvedla FGG, Katedra za geodezijo, Ljubljana. Meritve kažejo, da je odlagališče globalno stabilno, pričakovano pa se lokalno kažejo vertikalni premiki zaradi posedanja odlagališča. FGG je naredila meritve brezplačno kot zahvalo za uporabo poligona za študentske vaje iz geodezije.

RŽV je izvajal redne meritve sukcije, inklinometrov in meritve pretokov in nivojev izcednih voda.

3.1.2 835 Izdelava PGD in pridobitev GD – Jazbec – ZI

Po izdelavi Revizije Varnostnega poročila ga je INKO revidiral. Nato so bili izvedeni zahtevani popravki. Konec junija je bilo Varnostno poročilo predano URSJV v pregled. Na osnovi pripomb URSJV je bila do konca leta pripravljena končna vsebina Varnostnega poročila za odlagališče Jazbec. Ta je bila v začetku leta 2012 predana URSJV v potrditev.

Izdelane so bile kontrolne meritve posedkov odlagališča oziroma prekrivke.

3.1.3 837 Izgradnja sistema dolgoročnega monitoringa Jazbec

Obrazložitev je podana v točki 3.2.6

3.1.4 839 Pripravljalna in vzdrževalna dela odlagališče Jazbec in druga zemljišča

Delavci RŽV so izvajali redno kontrolo stanja saniranega odlagališča in ostalih saniranih površin na širšem območju nad zaprto jamo. Izvajala so se manjša tekoča vzdrževalna dela, ki so jih izvajali delavci RŽV.

Površina odlagališča je zatravljena. Izvedena je bila košnja trave, ki so jo izvedli okoliški prebivalci. RŽV je pokrila stroške baliranja. Ob ograji odlagališča se je izvedlo odstranjevanje podrasti in grmovja. Druga vzdrževalna dela na površini odlagališča niso bila potrebna.

Izvajalo se je redno čiščenje kanalov, jarkov in propustov na celotnem območju (odstranjevanje kamenja, grmovja, trave), ki ima vpliv na odlagališče Jazbec in za katere je pristojen RŽV (od P-1, P-9 do iztoka v Brebovščico).

Izvedel se je redni obhod betonskega prepusta pod odlagališčem in jaška z drenažnimi vrtinami. Obenem se je izvedlo vzorčevanje voda v propustu. Po potrebi se je očistilo merilno mesto Jazbec.

Na dostopni cesti so se redno čistili kovinski drežniki in pesek z bankin, tako da so ceste ostale v dobrem stanju.

Delavci vzdrževalci so sodelovali pri izvedbi rednih meritev inklinometrov in vzorčevanju voda na območju odlagališča Jazbec.

3.2 Odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt

Sanacijska dela na odlagališču rudarske jalovine Jazbec so bila končana v letu 2010. V letu 2011 se je prvo leto izvajalo dolgoročno upravljanje.

Sanacijska dela so predstavljala interventna raziskovalna drenažna dela kot dokončanje načrtovanih sanacijskih del na odlagališču HMJ Boršt v skladu z Noveliranim programom št. 2. Realizacija je bila 93,7 %.

3.2.1 801 Raziskave in verifikacija normativov Boršt – ZI

V okviru tehničnega monitoringa, načrtovanega na osnovi Varnostnega poročila, je FGG, Katedra za geodezijo, opravila redno letno meritev »Precizne geodetske meritve stabilnosti Boršt 2011«. Na osnovi meritev je bilo ugotovljeno, da se je v enem letu merilni steber – točka 1, premaknil za 107,81 mm v azimut 372,88° in se po višini tokrat dvignil za 25,6 mm. Steber – točka 2, se je v istem časovnem obdobju premaknil za 91,8 mm v azimut 386,82° in posedel za 18,0 mm. Velikost premikov preostalih merskih točk v opazovalni mreži kaže približno enake vrednosti kakor omenjeni točki, vendar se je v primerjavi s predhodno meritvijo hitrost premikov vseh točk nekoliko zmanjšala, kar pripisujemo dejstvu, da je bilo v istem obdobju med najnovejšo in predhodno meritvijo nekoliko manj padavin, ki so imele tudi nekoliko drugačno razporeditev. Smer vektorjev premikov je enaka kot je bila v prejšnjem merilnem obdobju.

V preteklem letu so bile izvedene meritve posedalnih plosč na območju odlagališča Boršt, ki kažejo, da se odlagališče še vedno poseda, vendar je potrebno omeniti, da gre del posedkov na račun vertikalnega premika plaz in da niso posledica posedanja odlagališča zaradi njegove konsolidacije.

Na območju odlagališča zaradi hitrosti premikov plaz trenutno nimamo nobenega uporabnega inklinometra. Po umiritvi premikov plaz bo potrebno izdelati nove inklinometre za opazovanje premikov plaz Boršt. Cena vrtine za inklinometer je približno 10.000 €.

Meritve nivojev podtalnice, pornih tlakov, sukcije, kemičnega stanja podtalnice v odlagališču, njegovi okolici in v plaz, ter meritve pretokov izcednih voda iz odlagališč se izvajajo redno.

Za izdelavo vodne bilance se je izvajalo vse meritve za pridobitev potrebnih podatkov.

3.2.2 804 Izdelava PGD in pridobitev GD za odlagališče Boršt – ZI

Izdelan je bil rudarski projekt in izvedena je bila revizija rudarskega projekta za sanacijo podgradnje in vrtanje vrtin v drenažnem rovu Boršt.

Izdelan je bil rudarski projekt za ureditev merilnega mesta Boršt.

Izveden je bil tehnični pregled končanih del na odlagališču Boršt. Dela je izvajal SCT in predložil tudi vso potrebno dokumentacijo. Ugotovljeno je bilo, da so vsa dela izvedena kvalitetno in v skladu s projektno dokumentacijo. Pozitivna odločba ni bila izdana, ker so premiki plazju večji, kot je določeno v Varnostnem poročilu. Postopek formalnega zaključka je bil s tem ustavljen. Za zmanjšanje premikov bi bili potrebni dodatni drenažni ukrepi, ki pa niso bili izvedeni.

3.2.3 814 Odlagališče Boršt – ZI

Ekološka sanacija odlagališča je bila končana leta 2010. Zaradi premikov podlage (plazu) odlagališča je Strokovni projektni svet določil dodatne ukrepe: sanacijo podgradnje v rovu Boršt in dodatne drenažne vrtine. Za izvedbo sanacije drenažnega rova in izvedbo raziskovalnih drenažnih vrtin je bil v letu 2010 na javnem razpisu izbrani izvajalec RGP d.o.o. Velenje, ki je z deli začel v letu 2010. Dela gradbene sanacije podgradnje v območju stika plazju s plazino, raziskovalnih drenažnih vrtin v zaledje odlagališča in poskusne drenažne vrtine pod odlagališče (1. faza) so bila končana v prvih mesecih leta 2011. Rezultati dreniranja so ugodni. Iztok vode iz zaledja je od 0,5 do 3 L/s, iztok iz vrtin pod odlagališčem pa je do 0,5 L/s. Iztok je odvisen od količine padavin. V letu 2011 je bilo teh izjemno malo, le 1000 mm/m² (povprečje je 1.800 mm/m²).

Za drugo polovico leta so bila načrtovana dela 2. faze dodatnih ukrepov (drenažne vrtine v plazju in pahljače drenažnih vrtine v zaledje). S tem bi bili podlaga odlagališča in zaledje dodatno drenirana, kar bi zmanjšalo možnost premikov plazju. Izveden je bil postopek javnega naročanja in izbran izvajalec. Dela niso bila izvedena, ker je minister ustavil financiranje in s tem niso bila zagotovljena sredstva za izvedbo.

3.2.4 817 Ceste na Boršt – ZI

Dela se niso izvedla, ker je bilo ustavljeno financiranje.

3.2.5 821 Nadzor nad izvajanjem del Boršt (strokovni nadzor +EU)

Strokovni nadzor nad izvajanjem del v rovu Boršt je izvajal tehnični vodja rudarskih del, ki je dela opravljal po pogodbi (v letu 2010 se je upokojil).

V novembru je opravil končni ogled in kontrolo sanacije RŽV tudi zunanji nadzor Wismut iz Nemčije. Izvedena je bila predstavitev za širšo strokovno javnost in lokalno skupnost. Podana je bila predstavitev izvajanja sanacijskih del v celotnem obdobju. Predstavljena je bila tudi trenutna situacija, v kateri se je znašel RŽV po prekinitvi financiranja s strani MOP. Wismut je podal končno poročilo o izvajanju nadzora za celotno obdobje od 2003-2010. Predstavitve se je udeležil tudi predstavnik Evropske investicijske banke.

Predstavljen je bil tudi problem reaktiviranja plazju odlagališča Boršt. Načrtovane interventne ukrepe, ki jih je predvidel Strokovni projektni svet, je Wismut v celoti podprl.

3.2.6 822 Izgradnja sistema dolgoročnega monitoringa – Boršt – ZI

V letu 2011 so bila dokončana vsa dela na ureditvi in označitvi merilnih in vzorčevalnih mest. Prav tako je bila dokončana adaptacija prostorov v objektu 106, kjer je urejen Center za dolgoročno upravljanje. Preselitev iz starih objektov, ki jih je imel RŽV v najemu, je bila izvedena v avgustu. S tem so dolgoročno zagotovljeni pogoji za izvajanje dolgoročnega upravljanja. Prav tako je na lokaciji zagotovljena v najmanjši meri tudi ohranitev kulturne dediščine o rudarjenju in pridobivanju urana ter možnosti izobraževanja.

3.2.7 823 Pripravljalna in vzdrževalna dela odlagališče Boršt – RŽV

Delavci RŽV so izvajali redno kontrolo stanja saniranega odlagališča in ostalih saniranih površin na širšem območju. Izvajala so se manjša tekoča vzdrževalna dela, ki so jih prav tako izvajali delavci RŽV.

Površina odlagališča je zatravljena. Izvedena je bila košnja trave. Ob ograji odlagališča se je izvedlo odstranjevanje podrasti in grmovja. Druga vzdrževalna dela na površini odlagališča niso bila potrebna.

Izvajal se je redni nadzor drenažnega rova in iztoka vode. Po izvedeni sanaciji so bile ugotovljene ponovne razpoke, kar kaže na nadaljevanje premikov plazov.

Izvajalo se je redno čiščenje kanalov, jarkov in propustov na celotnem območju (odstranjevanje kamenja, grmovja, trave), ki ima vpliv na odlagališče Boršt.

Na dostopni cesti so se redno čistili kovinski drežniki in pesek z bankin, tako da so ceste ostale v dobrem stanju. Problematičen ostaja klanec na spodnjem delu odlagališča, ki ga voda ob vsakem nalivu močno poškoduje. Načrtovano je bilo asfaltiranje, vendar zaradi ustavitve financiranja ni bilo izvedeno.

Redno se je izvajalo čiščenje merilnih mest in vremenske postaje Boršt.

Delavci vzdrževalci RŽV so sodelovali pri izvedbi rednih meritev in vzorčevanju voda na območju odlagališča.

Na pridobivalnem prostoru Jaka so bila izvedena manjša drenažna dela. Material, ki je bil pripeljan iz rova Boršt, je bil kot drenaža vgrajen na delu, kjer se je zadrževala voda. Prav tako je bilo urejenih nekaj dodatnih kanalov za odtok vode iz hudourniških studencev. S tem je preprečena erozija površine. Dodatno dreniranje bo urejeno v letu 2012, če bo potrebno.

4.0 MONITORING IN VZDRŽEVANJE (UPRAVLJANJE)

Upravljanje saniranih objektov obsega monitoring in vzdrževanje. V letu 2011 se je vzdrževanje saniranih objektov izvajalo še v okviru drugih vzdrževalnih del. Stroški monitoringa so bili manjši od načrtovanih. Pri nekaterih izvajalcih je bila dosežena nižja cena kot v prejšnjih letih, en izvajalec je naredil brezplačno kontrolne meritve. Zaradi racionalizacije in zaradi vremenskih pogojev (sušno leto) se je zmanjšal obseg vzorčevanja voda, s tem tudi število analiz in porabe materiala (filtrov). Zaradi stabilnih razmer je bilo manj popravil in vzdrževanja opreme. Stroški so prikazani v Tabeli 11. Dosegli so 82,0 % in so precej nižji od načrtovanih.

Aktivnosti monitoringa so obsegale nadzor delovnega okolja, emisij posameznih rudniških objektov ter nadzor vpliva rudniških objektov na okolje. RŽV je s svojimi delavci izvajal naslednja dela in aktivnosti:

- izvajanje vzorčenja tekočih emisij odlagališča ter dela imisij, pripravo vzorcev za analize v zunanjih laboratorijih in njihov transport,
- izvajanje meritev sevanja, zagotavljanje delovanja kontinuirano delujočih merilnih naprav ter postaj,
- izvajanje meritev nivojev podtalnice, inklinometrov, ekstenziometra, sukcije, pornih tlakov, pretokov tekočih voda, nadzor stanja odlagališč Jazbec in Boršt ter površin saniranih nekdanjih začasnih rudniških objektov,
- meritve sevanja v delovnem okolju, kontaminiranosti površin, opreme in predmetov,
- košnjo zatravljenih površin odlagališč Jazbec in Boršt za okrepitev travne ruše in preprečitev vodne erozije površin,
- zbiranje podatkov, njihova obdelava, arhiviranje, vodenje baze podatkov RŽV,
- izdelava predpisanih in drugih poročil.

Analize tekočih vzorcev so izvajali Zavod za zdravstveno varstvo Kranj (kemični parametri odpadnih voda), ERICo Velenje (uran in kemični parametri tekočih voda ter podtalnice), Institut Jožef Stefan Ljubljana (radij, ostali potomci urana), Zavod za varstvo pri delu Ljubljana (kontinuirane meritve radona), nadzor radioaktivnosti v okolju pa Institut Jožef Stefan in Zavod za varstvo pri delu.

Monitoring in meritve so potekali skladno z Varnostnimi poročili za odlagališči Jazbec in Boršt. V letu 2011 je vsebina del po obsegu in vrednosti nižja kot prejšnja leta. Vse aktivnosti so bile izvedene v skladu z načrtovanjem in so potekale tekoče. Vse analize so izvajali zunanji akreditirani izvajalci.

Celotni stroški monitoringa obsegajo nadzor nad vplivi na okolje, laboratorijske analize raznih elementov in druge meritve ter stroški dela tistih delavcev RŽV, ki izvajajo neposredne naloge monitoringa. S tem je prikazana dejanska vrednost predpisanega programa monitoringa. V letu 2011 pa niso bili še vključeni stroški infrastrukture in opreme, ki so se še pokrivali v zagotavljanju pogojev kot skupni stroški RŽV.

.

5.0 ZAGOTAVLJANJE POGOJEV

Ostala dela, ki jih imenujemo zagotavljanje pogojev, so se izvajala tekoče v skladu z načrtovanjem oziroma z dejanskimi potrebami. Stroški so zbirno prikazani v Tabeli 4, posamično pa v Tabelah 5 – 10. Realizacija je bila 80,8 %, kar kaže, da se stroški, ki so sicer stalnega značaja, zmanjšujejo, oziroma, da se nekatera dela niso izvajala.

V Noveliranem programu št. 2 so kot zagotavljanje pogojev navedene vse tiste aktivnosti, ki omogočajo nemoteno izvajanje osnovnih izvedbenih projektov, in tista dela, ki so potrebna za nemoteno poslovanje javnega podjetja. Teh del ni mogoče načrtovati v sklopu izvajanja posameznih projektov ali organizacijskih enot. Obseg se ne spreminja bistveno z obsegom poslovanja. Stroške opredelimo kot fiksne stroške podjetja.

Kot podpoglavje so tu uvrščene tudi odškodnine in nabava potrebne opreme.

Zagotavljanje pogojev obsega:

- varstvo pri delu in varstvo pred IO sevanji,
- infrastrukturo in tehnološke sklope,
- skupne naloge.

5.0.1 Varstvo pri delu in varovanje zdravja

Varstvo zaposlenih delavcev je bilo zagotovljeno v potrebnem in predpisanem obsegu. Skupni stroški so bili nižji od načrtovanih, ker RŽV ni poravnal obveznosti do Gasilskega društva Gorenja vas v višini 8.000,00 € za pripravljenost intervencije na saniranem območju v primeru potrebe, ker ni bila izvedena nobena reševalna vaja in ker so bili zdravniški pregledi zaposlenih premaknjeni v začetek leta 2012. Stroški varstva pri delu in varovanja zdravja so prikazani v tabeli 5. Realizacija je bila 8,4 %.

5.0.2 Infrastruktura in tehnološki sklopi

Infrastrukturo sestavljajo vsi objekti in postrojenja, ki jih RŽV potrebuje za zagotavljanje pogojev. Stroški so razdeljeni na vzdrževanje infrastrukture in na obratovanje tehnoloških sklopov. Prikazani so v Tabeli 6. Realizacija je bila 78,6 %.

Vzdrževanje infrastrukture

V letu 2011 se je zagotavljalo pogoje za izvajanje del, vzdrževalo infrastrukturne objekte, v katerih obratujejo tehnološki sklopi skupnega pomena:

- vzdrževanje objektov, ki jih uporablja RŽV,
- vzdrževanje drugih naprav in instalacij, zemljišč in cest.

Obratovanje tehnoloških sklopov

Obratovanje tehnoloških sklopov predstavlja zagotavljanje oskrbe z električno energijo in s toplotno energijo (v novih prostorih so stroški za toplotno energijo bistveno nižji), komunalno oskrbo, varovanje in čiščenje. V celoti dela izvajajo zunanji izvajalci.

V novembru so bili Občini Gorenja vas Poljane vrnjeni prostori, ki jih je imel RŽV v najemu od leta 2006 in s tem izpraznil vse prostore, ki jih je uporabljal. Iz območja sedanje Gospodarske cone je bil preseljen tudi kontejner za vnetljive snovi. S tem se je RŽV iz območja GC Todraž v celoti umaknil.

5.0.3 Skupne naloge

Stroški skupnih nalog so prikazani v Tabeli 7. Stroški so dosegli 89,3 % in so bili nekoliko nižji od načrtovanih.

Skupne naloge obsegajo:

- vodenje podjetja in organizacijskih enot,
- tehnično pripravo in nadzor za skupne dejavnosti,
- splošno kadrovska in druga splošna dela,
- finančno računovodska dela,
- komercialna dela,
- upravljanje premoženja,
- usposabljanje.

Skupne naloge, ki obsegajo zgoraj navedene aktivnosti, so bile v celoti izvedene. Potrebno je omeniti PTT stroške, ki so se po preselitvi v nove prostore bistveno zmanjšali (najemnina za tel. centralo ni več) in manjše stroške odvetniških storitev. Najpomembnejši del stroškov so stroški za plače delavcev, ki so razporejeni na skupne naloge. V to skupino spadajo: direktor, vodja finančno računovodske službe, ki opravlja tudi dela tajnice, in vodja tehničnega sektorja (dela so se izvajala le občasno).

5.1 Odškodnine

Stroški odškodnin so stroški za uporabo tujih zemljišč in stroški, ki so posledica uporabe zemljišč, katerim je bila namembnost spremenjena zaradi izvajanja rudarske dejavnosti (zakonska obveza). Prikazani so v Tabeli 8 in so dosegli 78,9 %.

5.1.1 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je zakonska obveza podjetja. Nadomestilo se plačuje za zemljišča, katerim je bila spremenjena namembnost. Največji del površin, od katerih se plačuje nadomestilo, obsegata jalovišči Jazbec in Boršt. Višina nadomestila je določena z zakonom. RŽV ga plačuje Občini Gorenja vas Poljane četrtletno. Ker je Občina Gorenja vas Poljane znižala nadomestilo, so bili stroški manjši. Plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se všteva v nadomestilo za omejeno rabo prostora.

5.1.2 Odškodnine za povzročeno škodo na tujih zemljiščih

Lastniku zemljišča, na katerem leži del odlagališča Boršt, se plačuje najemnina dvakrat letno (ob koncu prvega četrtletja in v četrtem četrtletju) na osnovi pogodbe med RŽV in lastnikom zemljišč.

RŽV ima na tujem zemljišču postavljena merilna mesta in vremensko postajo Boršt. Zato je RŽV dolžan plačevati najemnino za ta zemljišča in odškodnino za dostop do merilnih mest. Ker končnega dogovora z lastnikom ni bilo mogoče doseči, se mu letno plačuje akontacija. Za leto 2011 so bila izvedena vsa plačila kakor tudi enkratna odškodnina za služnost dostopa do drenažnega rova zaradi izvajanja zemeljskih del v rovu Boršt.

5.2 Oprema

V letu 2011 je bila nabavljena samo oprema za izvajanje dolgoročnega monitoringa. Za merilna mesta so bili nabavljeni avtomatski čitalci pretokov za drenažne vrtine v rovu Boršt. Finančna realizacija je prikazana v Tabeli 10: Dosegla je 19,0 %.

5.3 Lastna dejavnost

Dejavnosti, ki niso neposredno izvajanje zapiralnih in sanacijskih del, so ločene, in se zanje vodi posebna evidenca. Prikazane so kot lastna dejavnost podjetja.

Ta dejavnost na eni strani prinaša prihodke, na drugi strani pa povzroča tudi stroške. V celoti se mora ta dejavnost financirati sama. Sredstva lastne realizacije, ki presegajo stroške, so v skladu z navodili MOP uporabijo za financiranje pre zaposlovanja in za odškodnino lokalni skupnosti kot nadomestila za omejeno rabo iz Uredbe o določitvi območja in višini nadomestila št. 00719-133/2007/11 z dne 21.02.2008.

5.3.1 Prihodki lastne dejavnosti

Prihodki lastne dejavnosti so prikazani v Tabeli 12 in obsegajo prihodke od izvajanja določenih dejavnosti tekočega leta in prihodke od dezinvestiranja. Prihodke od izvajanja dejavnosti prikazujejo SN od 951 do 957. Razvidno je, da so bili realizirani prihodki večji od načrtovanih. Velik del prihodkov predstavljajo dividende Gorenjske banke. Večji so bili tudi prihodki od obresti in prihodki od drugih storitev. Največji posamezni prihodek predstavlja dezinvestiranje.(SN 960). V letu 2011 je bilo prodanih 517 delnic Gorenjske banke. Prodajo je odobril NS družbe. Prodano je bilo tudi počitniško stanovanje v Nerezinah. Prodaja je bila izvedena z zbiranjem ponudb. Lastna sredstva preteklih let so sredstva, ki so bila pridobljena z dezinvestiranjem v prejšnjih letih, a niso bila porabljena.

5.3.2 Stroški lastne dejavnosti

Stroški lastne dejavnosti so prikazane v Tabeli 13. Stroški lastne dejavnosti obsegajo stroške izvajanja lastnih dejavnosti, ki so prikazani od SN od 901 do 912. Stroški so bili nižji od načrtovanih. Od SN 930 do SN 933 pa so prikazani odhodki za investicije in nadomestilo za omejeno rabo prostora. Obrazložitev sledi v točkah 5.3.3 in 5.3.4..

5.3.3 Izgradnja gospodarske cone Todraž

Na osnovi 8. člena Pogodbe o neodplačnem prenosu nepremičnin (PNPN) na Občino Gorenja vas – Poljane, sklenjeno med MOP, Občino in RŽV, je RŽV dolžan iz lastnih sredstev financirati komunalno opremljanje zemljišča, ki je bilo neodplačno preneseno na Občino Gorenja vas – Poljane. RŽV vseh obvez iz navedene pogodbe ni izpolnil, ker je prišlo do sprememb in časovnih zamikov. V letu 2011 investicij ni bilo. Obveznost RŽV iz PNPN je še širitev čistilne naprave Gorenja vas in izgradnja vodohrana.

5.3.4 Nadomestilo za omejeno rabo prostora

Na osnovi Uredbe o določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju Rudnika urana Žirovski vrh (Ur.l. RS, št. 22/2008) je RŽV od leta 2008 dalje dolžan plačevati nadomestilo za omejeno rabo prostora Občini Gorenja vas – Poljane. S spremembo

navedene Uredbe v letu 2009 je bila odškodnina zmanjšana za 50 %. Za leto 2011 je bilo z odločbo, ki jo je izdala Občina Gorenja vas – Poljane, določeno nadomestilo v višini 525.992,88 €.

Vir sredstev za pokrivanje stroškov nadomestila za omejeno rabo prostora so lastna sredstva preteklih let in sredstva, pridobljena z dezinvestiranjem v tekočem letu. V odškodnino se všteva tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga je RŽV v letu 2011 plačal 111.346,88. Do avgusta 2011 je RŽV plačal še 276.424,00 € nadomestila z lastnimi sredstvi. Ko je minister ustavil financiranje dejavnosti RŽV, je RŽV ustavil plačilo nadomestila Občini, da je ohranil sredstva za izvajanje lastne dejavnosti. Dolg do Občine Gorenja vas Poljane za leto 2011 je tako ostal v višini 138.222,00 €.

5.3.5 Dezinvestiranje

V PN 2011 je bilo načrtovano dezinvestiranje v obliki prodaje nepremičnin in vrednostnih papirjev.

Prodaja nepremičnin

Prodaja nepremičnin je obsegala prodajo počitniškega stanovanja v Nerezinah. Stanovanje je bilo ocenjeno in prodano po postopku zbiranja ponudb. Prodaja je bila objavljena v uradnem listu RS in v dnevnikih časopisih. Dosežena prodajna vrednost je bila 56.000,00 €.

Prodaja vrednostnih papirjev

Prodano je bilo 517 delnic Gorenjske banke po ceni 700,00 € za delnico. Prodajo je odobril NS družbe.

5.4 Prezaposlovanje

Na dan 01.01.2011 je bilo v delovnem razmerju 7 delavcev in se je do konca leta zmanjšalo za enega delavca, ki se je redno upokojil. Ob koncu leta je bilo zaposlenih 6 delavcev.

Ker ni bilo prezaposlitev, premija za ta namen ni bila porabljena.

6.0 FINANČNI DEL

Finančni del obsega naslednjo vsebino poslovanja javnega podjetja:

- navedbo virov financiranja,
- prikaz celotnih stroškov izvajanja projekta zapiranja v letu 2011,
- prikaz pokritja stroškov z viri sredstev,
- prikaz poslovnega izida in bilanco stanja.

6.1 Viri financiranja

Za pokrivanje stroškov poslovanja RŽV in izvajanje programa trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude ter preprečevanje posledic rudarjenja v letu 2011 predstavljajo osnovni vir sredstva proračuna RS in lastna sredstva RŽV. Za ostalo dejavnost so vir lastna sredstva .

6.1.1 Proračunski viri

Osnovni vir financiranja javnega podjetja so v letu 2011 predstavljala razpoložljiva sredstva proračuna RS za namen financiranja projekta zapiranja rudnika. Na osnovi Rebalansa proračuna RS za leto 2011 so bila RŽV zagotovljena naslednja sredstva:

01020405 zapiranje rudnika Žirovski vrh	1.441.614,00 €.
---	-----------------

Vlada RS PN 2011 ni sprejela, ker ga minister ni poslal v sprejem.

Koriščenje proračunskih sredstev je bilo zagotovljeno kot začasno financiranje od januarja do konca julija 2011 s podpisom naslednjih dokumentov:

– Pogodba št. 2511-11-200015 z dne 10.05.2011	341.000,00 €
– Aneks št.1 k Pogodbi št. 2511-11-200015, z dne 08.06.2011	455.000,00 €
Skupaj	796.000,00 €

6.1.2 Lastni viri

Lastni viri izhajajo iz lastne realizacije na trgu, najemnin, obresti, prodaje nepremičnin, vrednostnih papirjev in ostalih virov ne proračunskega izvora. Realizacija je prikazana v Tabeli 12. Celotna sredstva so znašala 635.827,14 €.

6.2 Celotni stroški

Celotni stroški podjetja so glede na namen porabe razdeljeni na dve vsebini:

- stroške za izvajanje projekta zapiranja,
- stroške lastne dejavnosti.

6.2.1 Stroški za izvajanje projekta zapiranja


Stroški za izvajanje projekta zapiranja obsegajo naslednje aktivnosti:

- sanacijo odlagališč Jazbec in Boršt,
- zagotavljanje pogojev,
- monitoring, upravljanje,

- odškodnine,
- nabava opreme.

V spodnji tabeli in grafikonu so prikazani stroški za posamezne aktivnosti zapiranja po vsebini:

Vrsta del	RŽV (€)	DELEŽ (%)
ODLAGALIŠČE JAZBEC	15.955,92	1,45
ODLAGALIŠČE BORŠT	451.012,41	40,89
ZAGOTAVLJANJE POGOJEV	191.012,32	17,32
MONITORING, UPRAVLJANJE	325.303,82	29,49
ODŠKODNINE	118.382,21	10,73
NABAVA OPREME	1.332,00	0,12
Skupaj	1.102.998,68	100,00

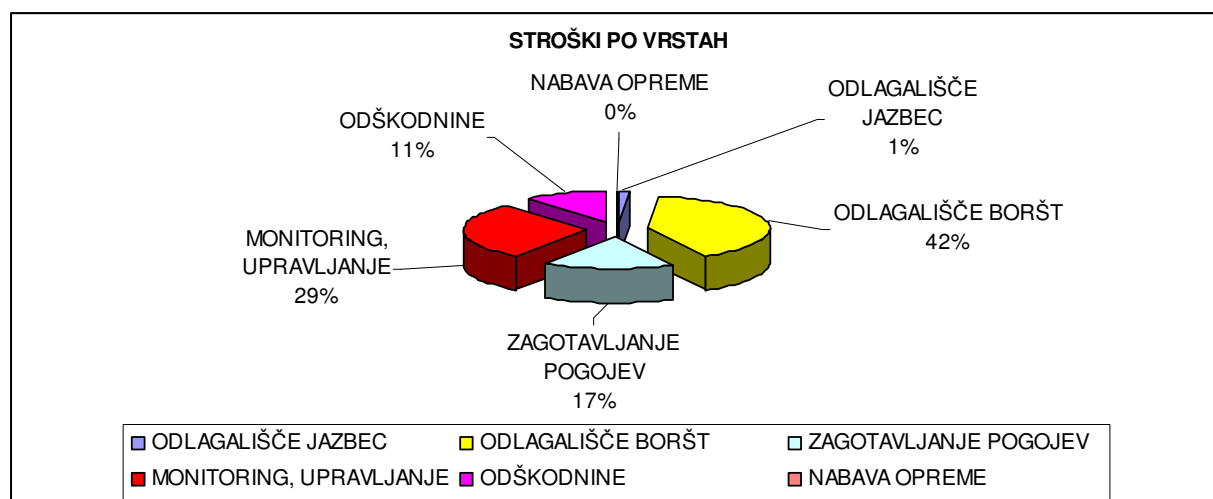

Grafikon: Stroški za posamezne aktivnosti po vsebini

6.2.2 Stroški lastne dejavnosti

Stroški lastne dejavnosti se ne financirajo s sredstvi proračuna. Stroški so prikazani v Tabeli 13.

Z lastnimi sredstvi so se pokrivali naslednji stroški:

- stroški, ki izhajajo iz izvajanja lastne dejavnosti na trgu,
- stroški odškodnine za omejeno rabo prostora za Občino Gorenja vas – Poljane,
- izgradnja Centra za dolgoročno upravljanje,

Vrsta del	RŽV (€)	DELEŽ (%)
Lastna dejavnost leta 2011	16.822,66	3,98
Nadomestilo za omejeno rabo prostora (Občina GVP)	276.424,00	65,40
Center za dolgoročno upravljanje	129.406,18	30,62
Skupaj	422.652,84	100,00

6.3 Pokritje stroškov z viri sredstev


6.3.1 Pokritje stroškov za izvajanje projekta zapiranja

Stroški projekta zapiranja so bili pokriti z naslednjimi viri:

- Stroški RŽV za izvajanje zapiralnih del in aktivnosti v obdobju januar – julij so bili pokriti s proračunskimi sredstvi, ki jih je RŽV prejel na osnovi Pogodbe o začasnem financiranju št. 2511-11-200015, Aneksa št. 1 k pogodbi, sklenjenima med MOP in RŽV in na njeni osnovi izstavljenih mesečnih situacij. Pogodba je bila podpisana z zamudo, šele 10. 05. 2011, prva sredstva pa je RŽV prejel šele 25. 05. 2011.
Odobrena sredstva so bila RŽV izplačana na osnovi začasnih situacij od št. 01 do št. 07.
- Stroški RŽV v obdobju od avgusta do decembra so bili pokriti z lastnimi sredstvi, ker se je minister odločil, da se od 01. 08. 2011 dejavnost RŽV iz proračuna ne bo več financirala.

Pokritje stroškov z viri sredstev je prikazano v diagramu

Vsebina	Proračun (€)	RŽV (€)	Skupaj (€)
Odlagališče Jazbec	12.130,56	3.825,36	15.955,92
Odlagališče Boršt	380.847,19	70.165,22	451.012,41
Zagotavljanje pogojev	116.842,98	74.169,34	191.012,32
Nabava opreme		1.332,00	1.332,00
Monitoring upravljanje	193.518,89	131.784,93	325.303,82
Odškodnine	79.796,04	38.586,17	118.382,21
Skupaj	783.135,66	319.863,02	1.102.998,68

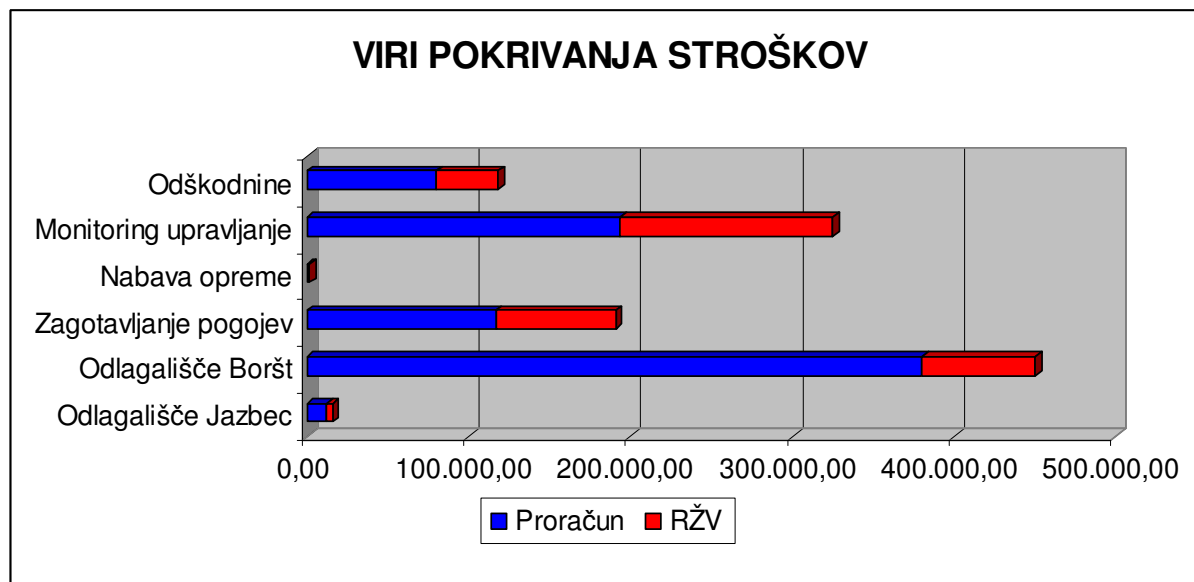

V skladu z Noveliranim programom št. 2 bi se morala dejavnost zapiranja financirati iz proračunskih sredstev. Ker MOP oziroma minister tega nista zagotovila, je moral RŽV stroške pokriti iz lastnih sredstev.

Neporavnana obveznost do SCT

V letu 2011 niso bili pokriti tudi stroški, ki so ostali neplačani za sanacijo odlagališča Boršt podjetju SCT. Po zaključku del v letu 2010 in tehničnem pregledu v letu 2011 še niso bili izvedeni postopki formalnega zaključka del. Nedokončane so ostale naslednje formalnosti:

- Podpis Aneksa 6 za določitev končne vrednosti del. Nato bo izdal izvajalec SCT zadnjo začasno situacijo v višini 60.360,97 € za opravljena dela v letu 2010 (takrat ni bilo pogojev za izvedbo plačila, ker ni bilo sredstev),
- Izvajalec bo nato izročil še končno situacijo in zagotovil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti,
- Po zagotovitvi garancije bo potrebno plačati zadržanih 10 % od pogodbene vrednosti, to je 1.013.264,45 €, predvidoma v letu 2012 ali 2013,
- Izvesti formalni prevzem opravljenih del, od katerega naprej bo tekel garancijski rok.

Celotna dokumentacija je bila predložena MOP v letu 2011 (g. Bojanu Erjavcu). Takrat je bilo na MOP odločeno, da se rešitev odloži. Žal zadeva še vedno čaka na rešitev.

Izkoristek proračunskih sredstev

Proračunska sredstva so bila izkoriščena izključno za izvajanje del v skladu z Noveliranim programom št. 2. Odobrena proračunska sredstva so bila 1.441.614,00 €, izkoriščena pa v višini 783.135,66 €. Neizkoriščeno je ostalo 658.478,34 €, oziroma 45,9 %.

6.3.2 Pokritje stroškov lastne dejavnosti

Stroški lastne dejavnosti so bili pokriti z naslednjimi viri:

- sredstva lastne realizacije tekočega leta,
- sredstva lastne realizacije preteklih let,
- sredstva od dezinvestiranja (prodaje delnic GB in počitniškega stanovanja).

Vsebina	RŽV (€)
Lastna dejavnost v letu	16.822,66
Nadomestilo za omejeno rabo prostora (Občina GVP)	276.424,00
Center za dolgoročno up.	129.406,18
Skupaj	422.652,84

Pačilo nadomestila za omejeno rabo prostora Občini Gorenja vas – Poljane

Nadomestilo je prikazano v višini, kot je bilo plačano. Neporavnani dolg do Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2011 ostaja v višini 138.222,00 €. Ker je vir za plačilo nadomestila lastna sredstva družbe, bo dolg lahko plačan le, če bodo iz proračuna poravnana sredstva, ki so bila porabljena v letu 2011 za izvajanje zapiranja.

6.5 Računovodski izkazi

Rezultati poslovanja so predstavljeni v Izkazu poslovnega izida (SRS 25, različica I) in v Bilanci stanja (SRS 24). Bilanci sta razvidni iz priloge 2 in priloge 3.

RŽV v svojih poslovnih knjigah evidentira in prikazuje v rezultatih poslovanja tiste poslovne dogodke, katere sam naroča in plačuje.

V poslovnih knjigah in v rezultatu poslovanja pa niso zajeti poslovni dogodki zapiralnih del zunanjih izvajalcev, ki prejemajo plačila direktno iz MOP. Ti poslovni dogodki se v RŽV evidentirajo le za potrebe spremljanja izvajanja plana in za kontrolo.

Iz Izkaza poslovnega izida je razvidno, da se je obseg dejavnosti RŽV v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 zmanjšal.

Prikazano poslovanje v izkazu poslovnega izida kaže dobiček 92.735,11 €. Vzrok za dobiček je prodaja delnic GB Kranj, ker je bila knjigovodska vrednost nižja od prodajne.

Višina premoženja in njegova struktura sta razvidna iz bilance stanja. Stalna sredstva so se v celoti povečala (zmanjšala so se zaradi prodaje stanovanja in amortizacije, povečala pa zaradi izgradnje Centra za dolgoročno upravljanje). Kratkoročna sredstva so se zmanjšala. Kapital se je povečal za pozitivni poslovni izid. Obveznosti do dobaviteljev so se zmanjšale, povečale pa so se druge obveznosti.

Kot je razvidno iz poročila in iz vseh prilog o prikazanih stroških in prihodkih, poteka celotno poslovanje v zmanjšanem obsegu in v okviru razpoložljivih sredstev. Družba je pokrivala obveznosti do dobaviteljev tekoče, ima pa zapadle obveznosti do Občine Gorenja vas – Poljane.

Poleg lastnega premoženja ima RŽV v upravljanju tudi zemljišča, ki so po veljavnih predpisih lahko le v lasti države. To so zemljišča državne infrastrukture, ki sestavljajo odlagališči Jazbec in Boršt. Ta zemljišča so vodena v RŽV v zunajbilančni evidenci.

7.0 ZAKLJUČEK

V letu 2011 so se zapiralna dela in ostale aktivnosti izvajale v skladu z Noveliranim programom št. 2, ki ga je sprejela vlada sredi leta 2006. Na osnovi sprejetega proračuna za leto 2011 je bilo iz proračuna RS za vse aktivnosti RŽV zagotovljenih 1.441.614,00 €.

V skladu s PN 2011 so se izvajala vsa načrtovana sanacijska dela do konca julija, vse ostale aktivnosti za zagotavljanje pogojev in poslovanja podjetja pa celo leto. Prav tako so bila zaključena dela, ki so se začela že pred ustavitvijo financiranja.

Izveden je bil tehnični pregled končanih sanacijskih del na odlagališču Boršt. Pozitivna odločba ni bila izdana, ker so premiki plazov Boršt večji, kot je to dovoljeno v Varnostnem poročilu za odlagališče Boršt.

Izdelano in revidirano je bilo Varnostno poročilo za odlagališče Jazbec. Izvajale so se aktivnosti za izvedbo formalnega zaključka sanacije, obenem pa se je začelo z dolgoročnim upravljanjem odlagališča.

Končani so bili raziskovalni interventni drenažni ukrepi (dodatne drenažne vrtine) in sanacija rova Boršt. Intenzivno so se nadaljevala in končala sanacijska dela na odlagališču

hidrometalurške jalovine Boršt. Dodatni načrtovani interventni drenažni ukrepi zaradi ne zagotovljenih finančnih sredstev niso bili izvedeni.

Izvajala so se vsa ostala dela, ki so zagotavljala pogoje za nemoteno delo zunanjih izvajalcev, kakor tudi nadzor nad vplivi na okolje, varstvo pri delu, potrebno vzdrževanje preostalih objektov in druga potrebna dela.

Poslovni načrt za leto 2011 ni bil potrjen, ker ga minister ni poslal Vladi RS v sprejem.

Financiranje je bilo začasno urejeno od januarja do konca julija. Kasneje RŽV po odločitvi ministra ni več prejel v letu 2011 nobenih sredstev, čeprav so bila ta v Rebalansu proračuna zagotovljena.

RŽV je poravnal odškodnino za omejeno rabo prostora do konca avgusta. Za ta namen hranjena lastna sredstva je RŽV kasneje uporabil za financiranje lastne dejavnosti do konca leta, zato je prenehal izpolnjevati obveznost do Občine Gorenja vas – Poljane.

Poslovanje je potekalo moteno, saj ni bil sprejet Poslovni načrt. MOP od avgusta dalje ni več financiral poslovanja RŽV, prav tako je bila s strani MOP prekinjena vsa komunikacija z RŽV. Kljub mnogim prošnjam za ureditev razmer s strani MOP ni bilo nobenega odziva. Zaradi take situacije sta odstopila predsednik NS dr. Samo Kopač in članica mag. Nives Nared. S tem Nadzorni svet ni bil več sklepčen in ni mogel delovati ter pomagati ob nastali situaciji.

PRILOGA 1 – TABELE STROŠKOV

TABELA 1	PLAN	Realizacija 2011					
REKAPITULACIJA STROŠKOV ZAPIRALNIH DEL	2.011	I. KVARTAL	II. KVARTAL	III. KVARTAL	IV. KVARTAL	SKUPAJ 2011	INDEX LET.
SKUPAJ TEHNIČNE AKTIVNOSTI	507.000	209.989,02	178.928,24	12.588,66	65.462,41	466.968,33	92,10
ODLAGALIŠČE JAZBEC	26.000	0,00	12.130,56	0,00	3.825,36	15.955,92	61,37
ODLAGALIŠČE BORŠT	401.000	209.989,02	166.797,68	12.588,66	61.637,05	451.012,41	112,47
ODLAGALIŠČE BORŠT - ZI - MOP	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ OSTALA ZAPIRALNA DELA	789.900	176.601,87	169.851,89	139.931,12	149.645,47	636.030,35	80,52
ZAGOTAVLJANJE POGOJEV	236.300	47.392,66	57.204,49	40.495,44	45.919,73	191.012,32	80,83
ODŠKODNINE	150.000	36.093,51	32.796,36	27.836,72	21.655,62	118.382,21	78,92
NABAVA OPREME	7.000	0,00	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	19,03
MONITORING, UPRAVLJANJE	396.600	93.115,70	78.519,04	71.598,96	82.070,12	325.303,82	82,02
SKUPAJ ZAPIRALNA DELA	1.296.900	386.590,89	348.780,13	152.519,78	215.107,88	1.102.998,68	85,05

TABELA 2	PLAN	Realizacija 2011					
STROŠKI PRENEHANJA OBRATOVANJA	2.011	I. KVARTAL	II. KVARTAL	III. KVARTAL	IV. KVARTAL	SKUPAJ 2011	INDEX LET.
SN ODLAGALIŠA JAZBEC							
834 Raziskave in verif.normativov	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
835 Izdelava PGD in pridobivanje GD za odlag. Jazbec	16.000	0,00	12.130,56	0,00	1.111,50	13.242,06	82,76
837 Izgradnja dolg. monitoringa -Jazbec	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
839 Pripr.+vzdr.dela odlag.+ostal.zemlj.	10.000	0,00	0,00	0,00	2.713,86	2.713,86	27,14
SKUPAJ ODLAGALIŠČE JAZBEC	26.000	0,00	12.130,56	0,00	3.825,36	15.955,92	61,37

TABELA 3	PLAN	Realizacija 2011					
STROŠKI PRENEHANJA OBRATOVANJA	2.011	I. KVARTAL	II. KVARTAL	III. KVARTAL	IV. KVARTAL	SKUPAJ 2011	INDEX LET.
SN ODLAGALIŠČA BORŠT							
ODLAGALIŠČE HMJ BORŠT							
801 Raziskave in verif. norm.	25.000	0,00	9.360,00	7.680,00	4.699,20	21.739,20	86,96
804 Izdelava PGD in pridobivanje GD za odlagališče Boršt	15.000	2.952,00	477,63	540,00	2.250,36	6.219,99	41,47
817 Cesta na Boršt	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 Nadzor nad izvajanjem del Boršt (strok. EU)	56.000	2.510,61	4.226,32	0,00	49.810,80	56.547,73	100,98
822 Izgradnja dolg. monitoringa -Boršt	280.000	124.454,75	149.609,13	0,00	0,00	274.063,88	97,88
823 Pripravljalna in vzdrževalna dela odlagališča Boršt	15.000	2.848,35	3.124,60	4.368,66	1.996,69	12.338,30	82,26
814 Odlagališče Boršt- ZI-MOP/ tunel	80.000	77.223,31	0,00	0,00	2.880,00	80.103,31	100,13
SKUPAJ ODLAGALIŠČE BORŠT	481.000	209.989,02	166.797,68	12.588,66	61.637,05	451.012,41	93,77
Od tega:						0,00	
RŽV	401.000	209.989,02	166.797,68	12.588,66	61.637,05	451.012,41	112,47
ZI MOP	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	TABELA 4	PLAN		Realizacija 2011				
	STROŠKI ZAGOTAVLJANJA POGOJEV	2.011	I.	II.	III.	IV.	SKUPAJ	INDEX
SN			KVARTAL	KVARTAL	KVARTAL	KVARTAL	2011	LET.
2.4.2	VARSTVO PRI DELU	15.600	540,08	210,00	279,53	281,60	1.311,21	8,41
2.4.3	ZAGOTAVLJANJE VZDRŽEVANJA INFRASTRUKTURE	68.700	19.277,38	13.255,31	11.007,97	10.481,61	54.022,27	78,64
2.4.4	SKUPNE NALOGE	152.000	27.575,20	43.739,18	29.207,94	35.156,52	135.678,84	89,26
	SKUPAJ ZAGOTAVLJANJE POGOJEV	236.300	47.392,66	57.204,49	40.495,44	45.919,73	191.012,32	80,83

	TABELA 5	PLAN		Realizacija 2011				
	STROŠKI VARSTVA PRI DELU	2.011	I.	II.	III.	IV.	SKUPAJ	INDEX
SN			KVARTAL	KVARTAL	KVARTAL	KVARTAL	2011	LET.
140	Osebnna zaščitna sredstva	300	124,88	0,00	39,53	35,60	200,01	66,67
141	Material za izvajanje meritev	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skupaj	600	124,88	0,00	39,53	35,60	200,01	33,34
150	Redni, izredni in specialni zdravstveni pregledi	3.000	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1,00
151	Osebnna dozimetrija, kontrolne meritve sevanja vzdrževanja	1.000	385,20	210,00	240,00	246,00	1.081,20	108,12
153	Reševalne vaje	11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skupaj	15.000	415,20	210,00	240,00	246,00	1.111,20	7,41
	SKUPAJ VARSTVO PRI DELU	15.600	540,08	210,00	279,53	281,60	1.311,21	8,41

	TABELA 6	PLAN		Realizacija 2011				
	STROŠKI VZDRŽEVANJA INFRASTRUKTURE	2.011	I.	II.	III.	IV.	SKUPAJ	INDEX
SN			KVARTAL	KVARTAL	KVARTAL	KVARTAL	2011	LET.
202	Gorivo za avtomobile	6.000	1.136,59	2.022,56	1.513,94	1.184,28	5.857,37	97,62
	Skupaj material	6.000	1.136,59	2.022,56	1.513,94	1.184,28	5.857,37	97,62
210	Vzdrževanje objektov	10.000	0,00	1.494,60	51,55	648,20	2.194,35	21,94
213	Popravila naprav (vzdrževanje opreme)	13.000	3.654,30	1.174,38	2.992,27	1.456,99	9.277,94	71,37
215	Registracija vozil	500	424,63	115,63	146,93	0,00	687,19	137,44
214	Vzdrževanje in pluzenje cest	4.000	811,57	0,00	0,00	0,00	811,57	20,29
	Skupaj storitve	27.500	4.890,50	2.784,61	3.190,75	2.105,19	12.971,05	47,17
	Skupaj vzdrževanje infrastrukture	33.500	6.027,09	4.807,17	4.704,69	3.289,47	18.828,42	56,20
	OBRATOVANJE TEHNOLOŠKIH SKLOPOV							
230	Električna energija	6.000	1.022,21	2.302,74	2.989,53	2.938,06	9.252,54	154,21
231	Toplotna energija	19.000	9.808,46	3.031,78	1.445,05	2.038,30	16.323,59	85,91
232	Komunalne storitve (voda, kanalščina, smetarina)	800	75,90	75,90	61,98	409,06	622,84	77,86
256	Varovanje	1.200	186,72	186,72	186,72	186,72	746,88	62,24
257	Čiščenje	5.200	1.110,00	1.983,00	1.110,00	1.110,00	5.313,00	102,17
212	Vzdrževanje delovnih oblek (pranje)	3.000	1.047,00	868,00	510,00	510,00	2.935,00	97,83
	Skupaj obratovanje tehnoloških sklopov	35.200	13.250,29	8.448,14	6.303,28	7.192,14	35.193,85	99,98
	SKUPAJ STROŠKI VZDRŽEVANA INFRASTRUKTURE	68.700	19.277,38	13.255,31	11.007,97	10.481,61	54.022,27	78,64

TABELA 7		PLAN	Realizacija 2011					
SN	STROŠKI SKUPNIH NALOG MATERIAL IN STORITVE	2011	I. KVARTAL	II. KVARTAL	III. KVARTAL	IV. KVARTAL	SKUPAJ 2011	INDEX LET.
300	- pisarniški material	3.000	193,36	280,28	71,45	3.570,06	4.115,15	137,17
301	- PTT stroški	8.000	1.819,42	2.260,91	1.185,37	860,29	6.125,99	76,57
302	- plačilni promet, bančni stroški, takse	1.200	352,24	410,88	419,64	247,38	1.430,14	119,18
303	- strokovna literatura (IAEA, Uranar)	4.200	765,53	2.453,60	158,16	111,80	3.489,09	83,07
304	- dnevnice, kilometrine, nočnine	3.000	0,00	1.003,96	1.908,16	60,25	2.972,37	99,08
305	- reprezentanca in promocija	4.000	0,00	284,30	922,50	2.186,95	3.393,75	84,84
330	- pogodbe o delu - nadzorni svet	6.000	0,00	894,29	487,20	4.967,74	6.349,23	105,82
331	- avtorski honorarji (prevodi, ceditve)	7.500	2.624,24	3.206,51	826,08	772,13	7.428,96	99,05
332	- zavarovanje	5.200	953,55	1.036,88	919,58	738,42	3.648,43	70,16
333	- prispevek za članstvo v GZ, članarine	600	228,23	10,65	10,65	40,67	290,20	48,37
335	- odvetniške storitve	3.000	78,00	0,00	50,40	54,00	182,40	6,08
336	- revizija računovod.izkazov in notr.kontrola	6.000	0,00	5.826,00	0,00	0,00	5.826,00	97,10
362	- usposabljanje za delo in varstvo pri delu	2.100	100,00	300,00	784,80	0,00	1.184,80	56,42
	Skupaj stroški materiala in storitev	53.800	7.114,57	17.968,26	7.743,99	13.609,69	46.436,51	86,31
	- stroški dela (2,2,2,2)	96.000	20.460,63	23.664,42	21.463,95	21.546,83	87.135,83	90,77
	- regres (2)	2.200	0,00	2.106,50	0,00	0,00	2.106,50	95,75
	Skupaj stroški dela	98.200	20.460,63	25.770,92	21.463,95	21.546,83	89.242,33	90,88
	SKUPAJ FIKSNE OBVEZNOSTI	152.000	27.575,20	43.739,18	29.207,94	35.156,52	135.678,84	89,26

TABELA 8		PLAN	Realizacija 2011					
SN	STROŠKI ODŠKODNIN	2011	I. KVARTAL	II. KVARTAL	III. KVARTAL	IV. KVARTAL	SKUPAJ 2011	INDEX LET.
337	- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	134.000	32.718,51	32.796,36	27.836,72	17.995,29	111.346,88	83,09
440	- odškodnine	16.000	3.375,00	0,00	0,00	3.660,33	7.035,33	43,97
	SKUPAJ ODŠKODNINE	150.000	36.093,51	32.796,36	27.836,72	21.655,62	118.382,21	78,92

TABELA 9		PLAN	Realizacija 2011					
SN	STROŠKI PREZAPOSLOVANJA	2011	I. KVARTAL	II. KVARTAL	III. KVARTAL	IV. KVARTAL	SKUPAJ 2011	INDEX LET.
401	Premije(2)	21.700	0	0	0	0	0,00	0,00
	SKUPAJ PREZAPOSLOVANJE	21.700	0	0	0	0	0,00	0,00

TABELA 10		PLAN	Realizacija 2011					
SN	OPREMA NAZIV	2011	I. KVARTAL	II. KVARTAL	III. KVARTAL	IV. KVARTAL	KUMULATIVA 2011	INDEX LET.
502	merilniki pretokov	1.500	0,00	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	88,80
503	oprema za čiščenje piezometrov	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	ročno orodje, instrumenti in druga oprema	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	računalniška oprema	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	programska oprema za bazo podatkov	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ OPREMA	7.000	0,00	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	19,03

TABELA 11		PLAN	Realizacija 2011					
SN	STROŠKI MONITORINGA	2011	I. KVARTAL	II. KVARTAL	III. KVARTAL	IV. KVARTAL	SKUPAJ 2011	INDEX LET.
	Izvajanje nadzora							
	Stroški materiala in električne energije							
110	Material za vzdrževanje merilnih vzorčevalnih in vremenske postaje, piezometrov, inklinometrov	3.000	183,78	359,34	135,46	235,16	913,74	30,46
111	Električna energija za obratovanje postaj, opreme	2.400	447,85	758,88	282,74	1.277,04	2.766,51	115,27
233	Material za laboratorij	2.000	357,19	0,00	0,00	0,00	357,19	17,86
	Skupaj stroški materiala in električne energije	7.400	988,82	1.118,22	418,20	1.512,20	4.037,44	54,56
	Stroški storitev zunanjih izvajalcev							
120	Ocena vpliva IO sevanja na okolje, dozimetrija, Rn	93.000	34.853,34	13.821,93	13.821,93	13.821,93	76.319,13	82,06
121	Nadzor tekočih in plinastih izpustov (odpadne vode, aerosoli)	8.000	710,43	258,55	1.221,82	1.395,56	3.586,36	44,83
122	Meritve radija v kompozitih tekočih izpustov	15.000	3.414,60	3.298,20	3.372,79	4.732,20	14.817,79	98,79
123	Meritve radioaktivnosti v tekočih izpustih	10.000	0,00	0,00	0,00	5.388,00	5.388,00	53,88
124	Oskrbovanje merilnih mest in priprava vzorcev	11.000	2.515,95	2.515,95	2.515,95	2.516,16	10.064,01	91,49
125	Obratovanje in vzdrževanje opreme, postaj, inklinometrov, nivometrov	17.000	970,06	5.191,54	2.283,54	136,31	8.581,45	50,48
126	Neradiološki in biološki nadzor vodotokov, meritve hrupa	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Kontrolne meritve inklinometrov, nivometrov	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Kemijske in radiološke analize	78.000	16.810,16	13.830,24	14.075,04	15.072,47	59.787,91	76,65
	Skupaj stroški storitev	248.000	59.274,54	38.916,41	37.291,07	43.062,63	178.544,65	71,99
	Skupaj material in storitve	255.400	60.263,36	40.034,63	37.709,27	44.574,83	182.582,09	71,49
127	Delo (5,5 ,5,5)	136.000	32.852,34	33.218,16	33.889,69	37.495,29	137.455,48	101,07
	Regres (5)	5.200	0,00	5.266,25	0,00	0,00	5.266,25	101,27
	Skupaj stroški dela	141.200	32.852,34	38.484,41	33.889,69	37.495,29	142.721,73	101,08
	SKUPAJ STROŠKI MONITORINGA	396.600	93.115,70	78.519,04	71.598,96	82.070,12	325.303,82	82,02

TABELA 12		PLAN	Realizacija 2011					
SN	PRIHODKI LASTNE REALIZACIJE	2011	I. KVARTAL	II. KVARTAL	III. KVARTAL	IV. KVARTAL	SKUPAJ 2011	INDEX LET.
951	- druge storitve MORS	4.000	1.159,91	4.871,93	1.563,50	1.494,33	9.089,67	227,24
952	- najemnine za zemljišča	3.000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	100,00
953	- stanarine	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
954	- prilivi od prodaje stanovanj	4.800	2.626,48	2.877,12	684,68	606,72	6.795,00	141,56
955	- počitniška dejavnost	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
956	- dividende	50.000	20.851,00	29.479,00	0,00	0,00	50.330,00	100,66
957	- obresti	3.500	1.039,49	912,17	867,05	3.443,76	6.262,47	178,93
	Skupaj lastna realizacija tekočega leta	65.300	25.676,88	39.640,22	3.115,23	7.044,81	75.477,14	115,59
960	- dezinvestiranje	556.000	800,00	56.000,00	503.300,00	250,00	560.350,00	100,78
	- lastna sredstva preteklih let	180.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ PRIHODKI LASTNE REALIZACIJE	801.300	26.476,88	95.640,22	506.415,23	7.294,81	635.827,14	79,35

TABELA 13		PLAN	Realizacija 2011					
SN	STROŠKI LASTNE REALIZACIJE	2011	I. KVARTAL	II. KVARTAL	III. KVARTAL	IV. KVARTAL	SKUPAJ 2011	INDEX LET.
901	- druge storitve MORS	8.000	949,31	1.209,69	3.461,74	1.090,25	6.710,99	83,89
902	- izplačilo po KP	8.000	0,00	2.178,05	0,00	0,00	2.178,05	27,23
903	- stroški počitniških kapacitet	400	0,00	907,29	0,00	0,00	907,29	226,82
906	- urejanje lastništva	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	- stroški stanovanj	1.800	195,76	946,05	201,83	345,99	1.689,63	93,87
910	- stroški stanovanjskega in odšk. sklada	1.600	0,00	0,00	0,00	1.758,00	1.758,00	109,88
911	- dotacije društvom in ustanovam	7.000	0,00	999,70	1.800,00	414,00	3.213,70	45,91
912	- dotacija sindikatu	2.000	0,00	0,00	200,00	165,00	365,00	18,25
	Skupaj stroški last. realizacije tekočega leta	29.000	1.145,07	6.240,78	5.663,57	3.773,24	16.822,66	58,01
930	- Gospodarska cona Todraž	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	- druga infrastruktura	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
932	- omejena raba prostora - nadomestilo	400.000	101.652,00	105.666,00	69.106,00	0,00	276.424,00	69,11
933	- center za dolgoročno upravljanje	100.000	4.404,00	49.872,22	54.938,52	20.191,44	129.406,18	129,41
	SKUPAJ STROŠKI LASTNE REALIZACIJE	579.000	107.201,07	161.779,00	129.708,09	23.964,68	422.652,84	73,00

RUDNIK ŽIROVSKI VRH,

javno podjetje za zapiranje rudnika urana d.o.o.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA - SRS 25, različica I

	2011	2010
1. Čisti prihodki od prodaje	12.873,00	10.864,93
Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in materiala	783,33	200,00
Prihodki od prodanih storitev	12.089,67	10.664,93
2. Sprememba vred.zalog proizv.in nedokonč.proizv.	0,00	0,00
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0,00	0,00
4. Drugi poslovni prihodki (s prevredn.posl.prihodki)	877.170,20	1.429.028,52
Prihodki proračuna	783.135,66	1.293.507,72
Prihodki od porabe in odprave dolgoročnih rezervacij	56.538,89	56.731,45
Prevrednotovalni poslovni prihodki	37.495,65	78.789,35
5. Stroški blaga, materiala in storitev	507.778,59	739.605,12
a) Nabavna vrednost prod.blaga in mater.ter str.porabl.j.mater.	24.318,70	34.196,40
b) Stroški storitev	483.459,89	705.408,72
6. Stroški dela	222.573,90	327.896,47
a) Stroški plač	163.938,19	240.195,15
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	23.045,02	33.565,08
c) Stroški drugih zavarovanj	12.067,96	17.807,33
d) Drugi stroški dela	23.522,73	36.328,91
7. Odpisi vrednosti	75.938,92	73.064,27
a) Amortizacija	72.897,98	72.120,37
b) Prevrednotov.poslov.odhodki pri neopred. sred.in opred.osn. sredstvih	1.933,21	943,90
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	1.107,73	0,00
8. Drugi poslovni odhodki	530.580,60	672.118,81
9. Finančni prihodki iz deležev	540.463,90	50.330,00
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini		
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah		
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	540.463,90	50.330,00
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0,00	0,00
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini		
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim		
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	6.262,47	6.560,04
a) Finančni prihod.iz poslovnih terjatev do družb v skupini		
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	6.262,47	6.560,04
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	3,05	0,00
a) Prevredn.finančni odhodki pri fin.naložbah v podj.v skupini razen v pridr.podj.		
b) Prevrednotovalni finančni odhodki pri finančnih naložb.v pridružena podjetja		
c) Drugi prevrednotovalni finančni odhodki	3,05	0,00
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	49,95	0,00
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	49,95	
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	77,85	0,00
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini		
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev	0,00	0,00
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	77,85	0,00
15. Drugi prihodki	3,73	5,40
16. Drugi odhodki	7.035,33	11.200,66
17. Davek iz dobička		
18. Odloženi davki		
19. Čisti poslov.izid obrač. obdobja(1+/-2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14)	92.735,11	-327.096,44

RUDNIK ŽIROVSKI VRH,

javno podjetje za zapiranje rudnika urana d.o.o.

Todraž 1

4224 GORENJA VAS**PRILOGA 3****BILANCA STANJA - SRS 24**

	2011	2010
A. Stalna sredstva	980.152,65	702.804,23
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva	6.998,25	25.501,38
1. Dolgoročno odloženi stroški poslovanja		
2. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja		
3. Dolgoročne premoženjske pravice	6.998,25	25.501,38
4. Dobro ime		
5. Predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva		
II. Opredmetena osnovna sredstva	952.992,54	633.897,93
1. Zemljišča in zgradbe	855.407,50	412.858,37
a) Zemljišča	338.760,96	338.760,96
b) Zgradbe	516.646,54	74.097,41
2. Proizvajalne naprave in stroji	97.585,04	125.711,79
3. Druge naprave in stroji		
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo	0,00	95.327,77
5. Osnovna čreda		
6. Večletni nasadi		
7. Predujmi za opredmetena osnovna sredstva		
III. Naložbene nepremičnine		
IV. Dolgoročne finančne naložbe	18.843,00	35.291,06
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	18.843,00	35.291,06
a) Delnice in deleži v družbah v skupini		
b) Druge dolgoročne finančne terjatve	18.843,00	35.291,06
2. Dolgoročna posojila		
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini		
b) Druga dolgoročna posojila		
V. Dolgoročne poslovne terjatve	1.318,86	8.113,86
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini		
2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	1.318,86	8.113,86
VI. Odložene terjatve za davek		
B. Kratkoročna sredstva	327.944,06	567.627,65
I. Sredstva za prodajo	0,00	0,00
II. Zaloge	0,00	0,00
1. Material		
III. Kratkoročne finančne naložbe	312.410,22	250.228,04
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	15,54
a) Delnice in deleži v družbah v skupini		
b) Druge kratkoročne finančne terjatve	0,00	15,54
2. Kratkoročna posojila	312.410,22	250.212,50
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini		
b) Kratkoročna posojila drugim	312.410,22	250.212,50

IV. Kratkoročne poslovne terjatve	2.874,11	290.642,87
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini		
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	2.475,85	78.554,49
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	398,26	212.088,38
V. Denarna sredstva	12.659,73	26.756,74
C. Aktivne časovne razmejitve	0,00	708,00
SKUPAJ SREDSTVA	1.308.096,71	1.271.139,88
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA	211.261,27	213.346,90
A. Kapital	881.037,33	788.302,22
I. Vpoklicani kapital - osnovni kapital	5.927.355,00	5.927.355,00
II. Kapitalske rezerve	47.419,18	47.419,18
III. Rezerve iz dobička		
IV. Presežek iz prevrednotenja		
V. Preneseni čisti poslovni izid	-5.186.471,96	-4.859.375,52
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	92.735,11	-327.096,44
B. Rezervacije	95.185,03	151.723,92
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti		
2. Druge rezervacije	95.185,03	151.723,92
C. Dolgoročne obveznosti	0,00	0,00
I. Dolgoročne finančne obveznosti		
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0,00	0,00
3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	0,00	0,00
III. Odložene obveznosti za davek		
Č. Kratkoročne obveznosti	331.874,35	331.113,74
I. Obveznosti, vključene v skup. za odtujitev		
II. Kratkoročne finančne obveznosti		
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	331.874,35	331.113,74
2. Kratkoročne poslovne obvez. do dobaviteljev	158.427,90	257.531,85
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	173.446,45	73.581,89
D. Pasivne časovne razmejitve	0,00	0,00
Vračunani stroški	0,00	0,00
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.308.096,71	1.271.139,88
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI	211.261,27	213.346,90

Todraž, 07.02.2012
